

# 아스콘 포장작업계획서

1.공사명: 하수도정비 중점관리지역 침수예방사업(2단계)

2.공사개요

-절삭후 아스콘 표층 포장복구:약 12,000㎡

3.공사일정

-전체 아스콘 표층포장 공사일정 : 2022년11월21일 ~ 11월25일(5일간)

1)시장주유소 및 성남초교인근

11월21일 절삭작업, 11월22일 표층포장

2)성광교회 및 남제벽화마을

11월22일 절삭작업, 11월23일 표층포장

3)남정현대아파트~남제동주민센터,우석로

11월23일 절삭작업, 11월24일 표층포장

4)우석로 신선마트~나인마트,덕월1길,덕월3길

11월24일 절삭작업, 11월25일 표층포장

4.위치도

1)시장주유소 및 성남초교인근






## 2)성광교회 및 남제벽화마을



## 3)남정현대아파트~남제동주민센터,우석로

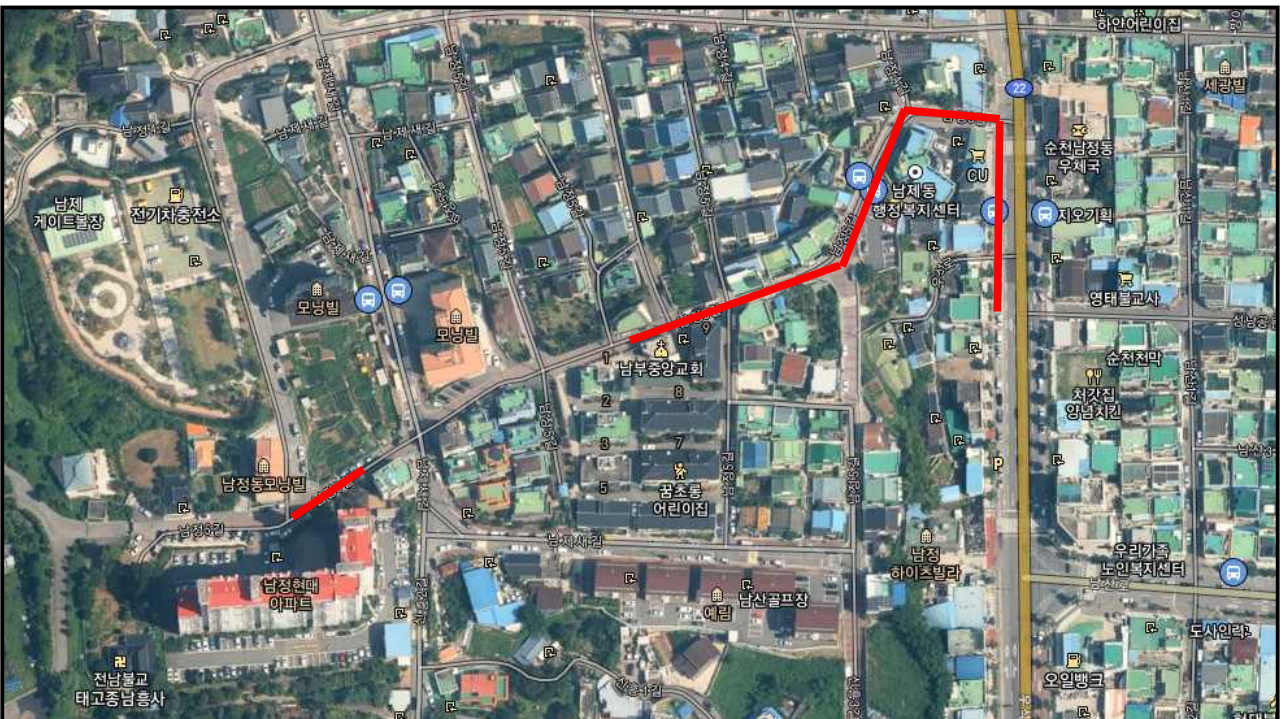



4)우석로 신선마트~나인마트, 덕월1길, 덕월3길



5. 투입인원

- 작업반장 1명, 포장공 10명, 신호수 4명

6. 투입장비

- 굴삭기 1대, 덤프트럭 2대, 살수차 1대, 소형파쇄기 1대, 바브켓 1대, 포장장비 1식

7. 교통처리계획

- 1)시장주유소 및 성남초교인근(11월21일 절삭작업,22일 표층포장작업)





2)성광교회 및 남제벽화마을(11월22일 절삭작업,23일 표층포장작업)



3)남정현대아파트~남제동주민센터,우석로(11월23일 절삭작업,24일 표층포장작업)





[illegible]
