

32 도심 공중선 지중화 단계적 추진

공약번호 3-13

사업
구분

신규 ☒
계속 ☐

추진
상황

일부추진 ☐ 정상추진 ☒
추진완료 ☐ 이행후 계속 ☐

완료
시기

임기 내 ☒
임기 후 ☐

재원

예산 ☒ 추진율
비예산 ☐ 55%

중앙정부 도움 필요성

해당없음 ☒ 도움필요(제도 ☐ 재정 ☐ 권한 ☐)

공약

• 도심 공중선 지중화 단계적 추진

목표

• 도심 속 주요 간선도로 전봇대 없는 도시 만들기 사업으로, 10개년 계획 수립 후 단계적 지중화 추진을 통해 쾌적한 환경 조성

사업개요

- 추진기간 2023. ~ 2032. (10년간)
- 추진장소 도심권 주요 간선도로(완료 7, 추진중 5, 계획 10)
- 사업비 1,546억 원(순천시^{50%} 773, 한전·통신^{50%} 773)
* 「가공배전선로의 지중이설사업 운영기준」제13조, 전기사업자는 50% 지원 가능
- 사업내용 주요 간선도로 한전(배전선로), 통신선로 지중화

추진실적

- 중앙로(남문교~의료원) 지중화 완료 : 2020. 12.
 - 저전길(남초교~남교오거리) 지중화 완료 : 2022. 6.
 - 이수로 ~ 팔마로 지중화 공사 착공 : 2023. 1.
 - 2025년 배전선로 지중화 사업 신청 : 2024. 7.
- * 순천고 ~ 남문교(0.7Km), 가곡삼거리 ~ 선평삼거리(1.8Km)

추진계획

- 2025년 지중화 사업 선정(산자부) 업무협약 : 2025. 1.
- 간선도로 지중화사업 대상지 조사 및 계획수립 : 2025. 2. ~ 4.
- 한전 및 통신 지중화 설계 : 2025. 5. ~ 7.
- 지중화사업 및 포장복구 완료 : 2026. 12.

연도별 재원투자

(단위: 백만원)

구분	합계	기투자	임기 내						임기 후
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
합계	77,300	19,400	19,500	3,400	3,400	3,400	4,500	4,800	38,400
국비	-	-	-	-	-	-			-
도비	-	-	-	-	-	-			-
시비	77,300	19,400	19,500	3,400	3,400	3,400	4,500	4,800	38,400
기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-

연도별 목표 및 추진계획

구분		이행률	추진계획
2024	2분기	50%	• 이수로~팔마로 지중화 사업 추진 중
	3분기	50%	• `25년 지중화 사업 신청(순천시)
	4분기	55%	• 팔마로 지중화 사업 추진(풍덕교~순천역~역전시장)
2025	1분기	60%	• 장명로(신청사) 지중화 사업 추진
	2분기	60%	• 이수로~팔마로 지중화 사업 준공
	3분기	70%	• `25년 지중화 사업 및 포장복구 착공
	4분기	70%	• `25년 지중화 사업 준공
2026	1분기	80%	• 업무협약 체결(시 - 한전)
	2분기	90%	• 한전,통신 지중화 설계 / `27년 지중화 사업 신청(순천시)
	3분기	90%	• `26년 지중화 사업 및 포장복구 착공
	4분기	100%	• `26년 지중화 사업 준공


*고압 송전선로 지중화 사업(2017~2026 / 934억(순천시 350억))

사업현황

(단위: 억원)

연번	위치	사업량	사업비	사업기간	진행상황	비고
총계	22건(완료 7, 공사 3, 발주 2, 계획 10)	29.63km	773			
소계	완료,추진 중인 사업(12건)	10.63km	296			
1	남산로~팔마로(팔마대교~이마트~홈플러스)	1.10km	30	2008.~2009.	완료	도로과
2	금곡길(순천향교~삼성생명)	0.47km	7	2016.~2018.	완료	도시재생
3	장평로(원예농협사거리~아랫장사거리)	0.72km	28	2017.~2019.	완료	도로과
4	중앙로(패션의거리, 중앙시장)	1.80km	28	2017.~2019.	완료	도시재생
5	중앙로(남문교~의료원)	0.45km	8	2018.~2020.	완료	도시재생
6	저전길(남초교~남교오거리)	0.32km	5	2020.~2022.	완료	도시재생
7	이수로, 팔마로(순고, 순천교, 풍덕교)	1.20km	36	2019.~2025.	공사중	도시재생
8	팔마로(풍덕교~순천역~역전시장)	0.68km	31	2022.~2025.	발주 (12월 착공)	도시재생
9	장명로(신청사 일원)	1.10km	27	2024.~2025.	발주 (1월 착공)	신청사
10	가곡 대광로제비앙	0.19km	15	2022.~2023.	완료	대광
11	왕지2지구 도시개발사업	2.40km	56	2023.~2024.	공사중	조합
12	신월지구 한양수자인	0.20km	25	2023.~2024.	공사중	한양
소계	계획중인 사업(10건)	19.00km	477			
1	중앙로(순천고~남문교/가곡삼거리~선평삼거리)	2.50km	63	신규신청	'25년 신청	도로과
2	우석로(순천고~청암대)	2.40km	60			
3	이수로(장대공원~조례사거리)	2.60km	65			
4	강남로(의료원~성동로터리~아랫장)	1.50km	38			
5	환선로(성동로터리~문화예술회관)	1.80km	45			
6	봉화로(성동로터리~봉화터널~삼성디지털)	1.70km	43			
7	봉화2길(국민은행~대림아파트)	1.20km	30			
8	충효로(홈플러스~오병원)	1.50km	38			
9	연향3로(동부상설시장 일원)	0.80km	20			
10	삼산로(순천대~용당동~순천소방서)	3.00km	75			

위치도

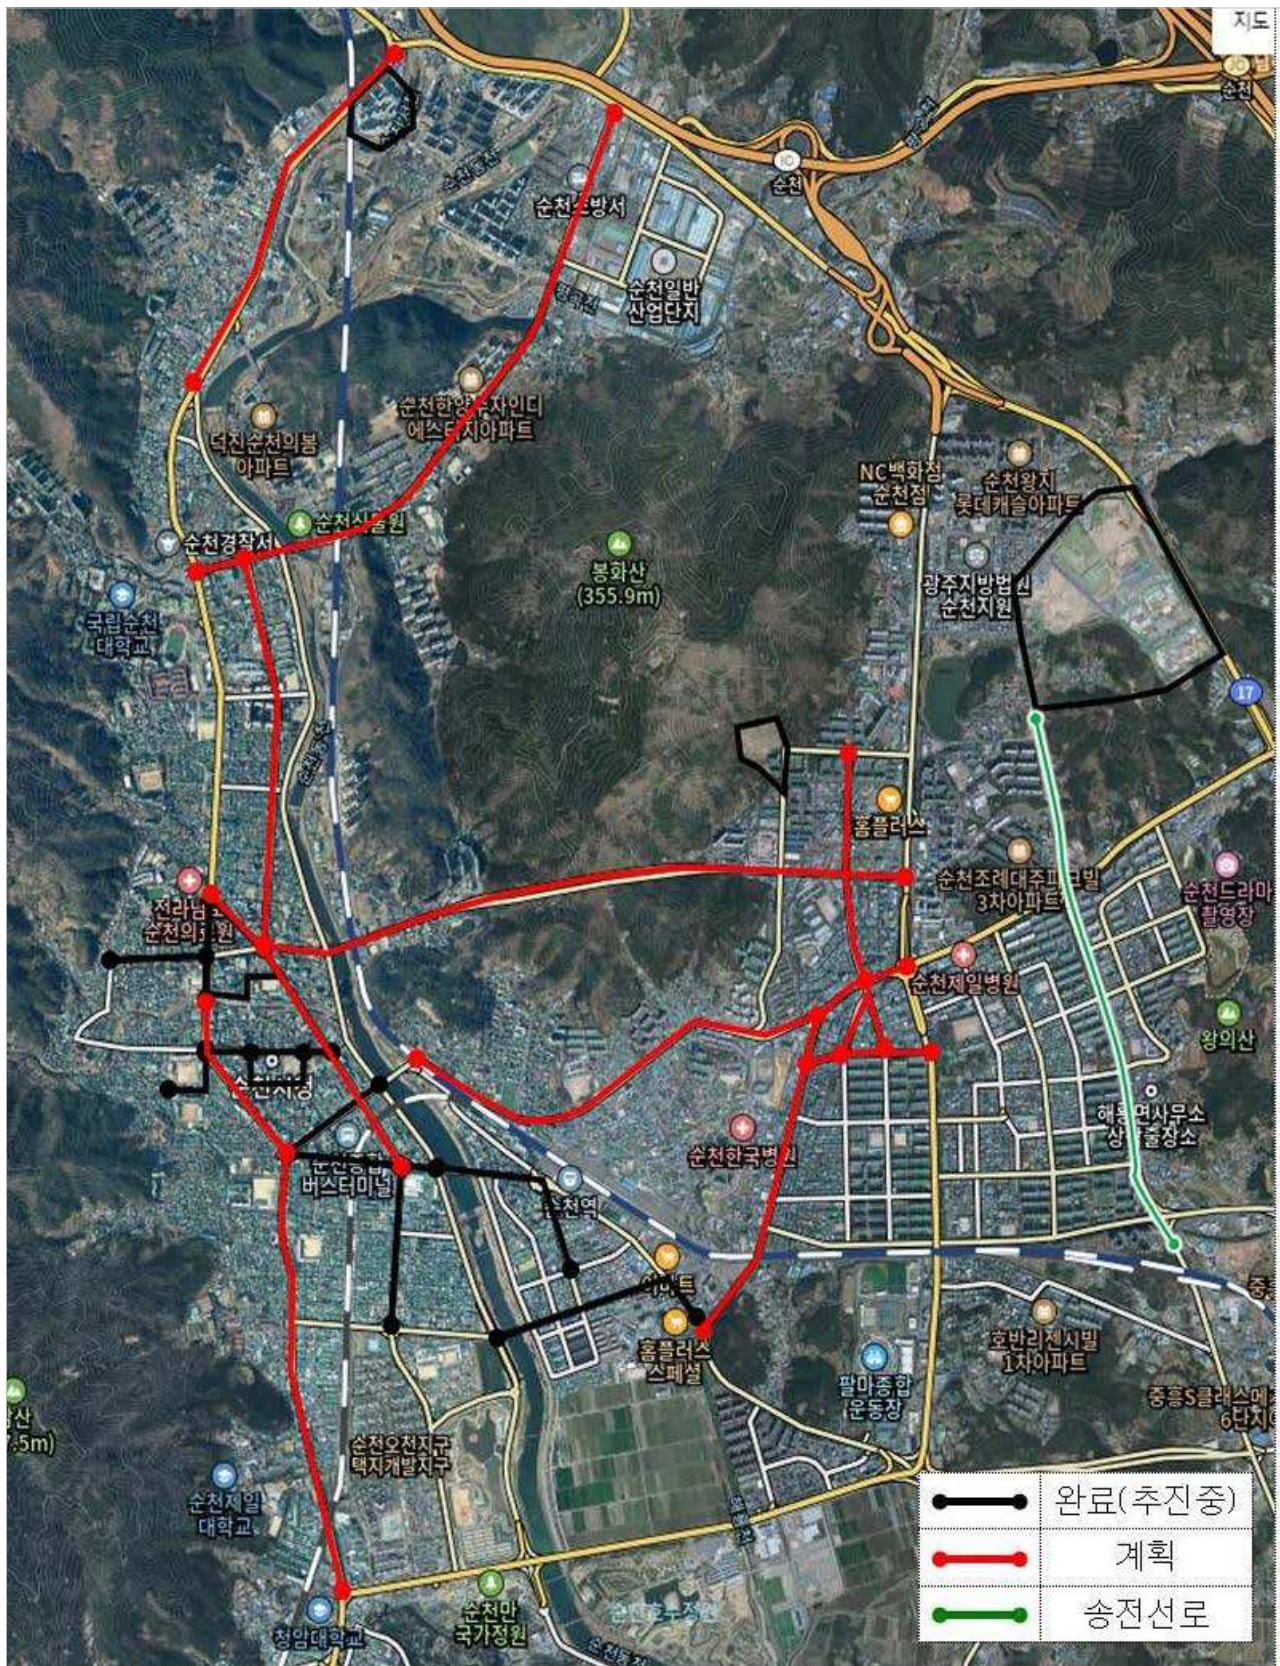

추진부서

주무부서 | 도로과장 서준원

팀장 | 도로정비2팀장 이재봉

담당자 | 박희찬 ☎ 6354
